

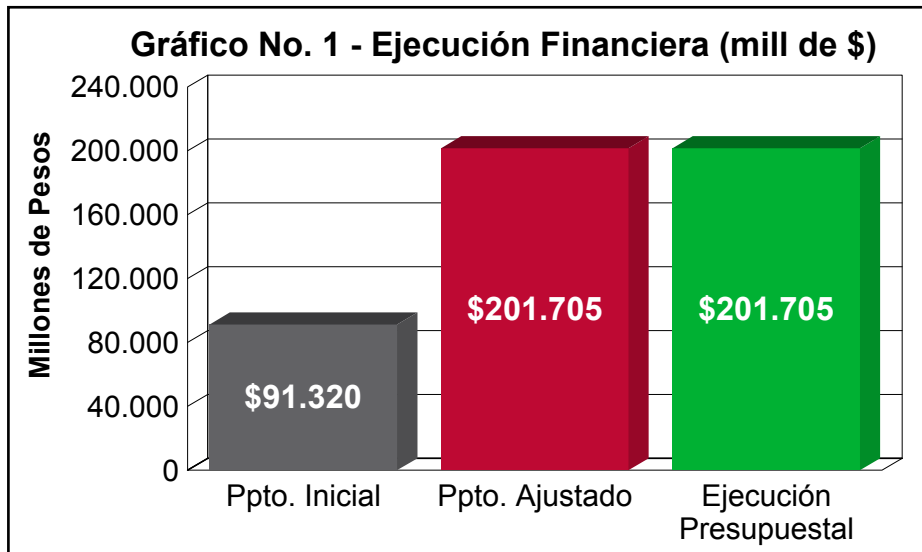
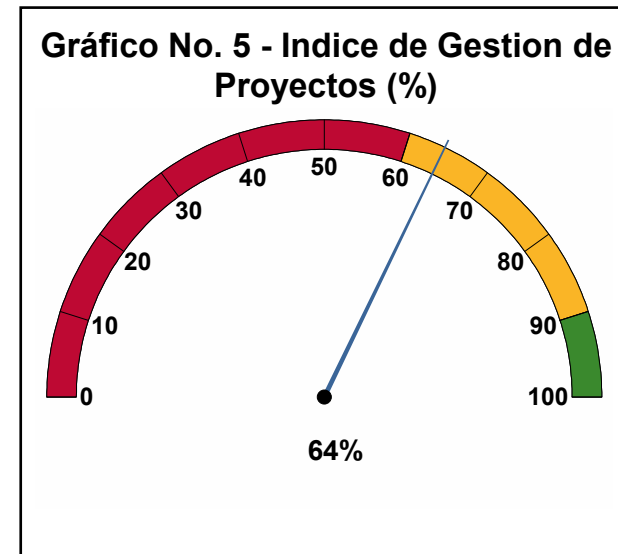


# Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (ISVIMED)

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2014

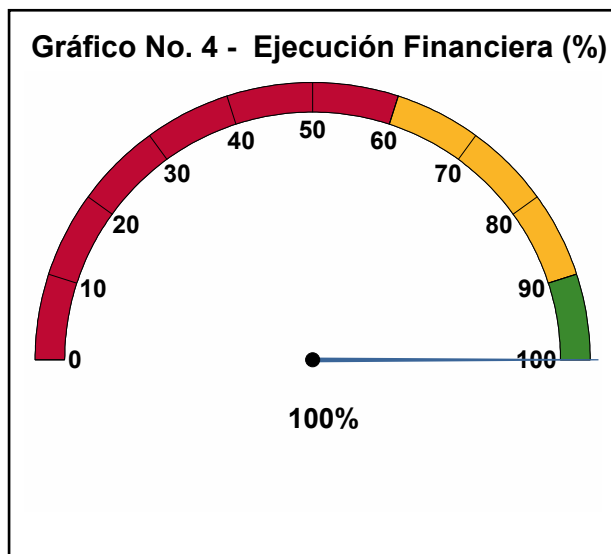

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas

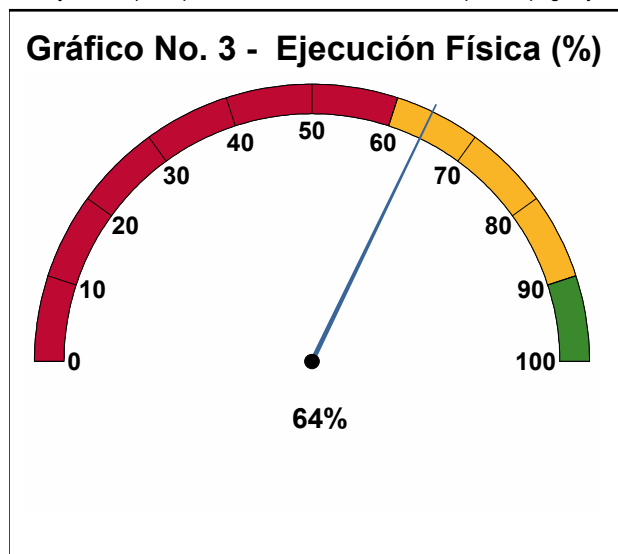

# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Línea:** 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida  
**Componente:** 1.1 - Seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidad  
**Programa:** 1.1.2 - Medellín protege los derechos humanos  
**Proyecto:** 120103 - Asignación de subsidios a la población desplazada para plan retorno

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 92% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 92%

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.434 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 811 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 811

---

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Información Financiera Total:** \$ 1.434 \$ 811 \$ 811

## Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV03AA Hogares que acceden a vivie plan retorno	Hogares	419	387	92%

**Línea:** 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno  
**Componente:** 2.5 - Vivienda y hábitat: derechos por la vida digna y la equidad  
**Programa:** 2.5.1 - Mejoramiento Integral del hábitat para la vida, la equidad y la cohesión social  
**Proyecto:** 120104 - Mejoramiento y legalización de vivienda de interés social en el municipio de medellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 29% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 29%

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.616 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.504 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.504

---

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Información Financiera Total:** \$ 5.616 \$ 5.504 \$ 5.504

## Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV04AA Hogares que acceden a mejora de vivienda	Hogares	1.921	892	46%
<b>Observación B / S:</b> Se tuvieron problemas con los diagnósticos de los operadores en la ejecución de los mejoramientos. Dificultades para conseguir la población en el caso de los mejoramientos sin barreras				
IV04AB Hogares que acceden legaliza de vivienda	Hogares	1.000	125	13%
<b>Observación B / S:</b> Se adelantaron gestiones para 1020 legalizaciones, de las cuales se levantó la planimetría y están listos los expedientes, pero no tuvieron ingreso a la curaduría por lo cual se contarán en el 2015				

**Proyecto:** 120105 - Titulación de predios a ciudadanos en el municipio de medellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 27% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 27%

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.359 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.737 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.737

<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
<b>Información FinancieraTotal:</b>		\$ 1.359		\$ 1.737		\$ 1.737

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV05AB Hogares que acceden titulación predios	Hogares	2.433	662	27%

**Observación B / S:** Se adelantaron las gestiones para 900 títulos de predios fiscales que se entregarán en el 2015. No se encontraron en el inventario más predios para titular.

**Programa:** 2.5.2 - Nuevas viviendas para la vida

**Proyecto:** 120106 - Asignación de subsidios y promoción para la adquisición de vivienda nueva en medellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 67%

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 24.049	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 41.017	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 41.017
----------------------------------	-----------------------------------	-----------	------------------------------------	-----------	---------------------------------------	-----------

<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 883	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 91.286	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 91.286
--------------------------	-----------------------------------	--------	------------------------------------	-----------	---------------------------------------	-----------

<b>Información FinancieraTotal:</b>		\$ 24.932		\$ 132.303		\$ 132.303
-------------------------------------	--	-----------	--	------------	--	------------

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV06AA Hogares que acceden viv nueva proy insti	Hogares	1.082	1.400	129%
IV06AC Hogares que acceden a vivienda opv	Hogares	200	68	34%

**Observación B / S:** A pesar de tener la programación de recursos, las OPV no dieron cumplimiento a los requisitos para acceder a los subsidios.

**Programa:** 2.5.3 - Acceso a bienes y servicios habitacionales alternativos para la equidad

**Proyecto:** 120107 - Asignación de subsidios para vivienda usada en medellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 4.928	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 996	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 996
----------------------------------	-----------------------------------	----------	------------------------------------	--------	---------------------------------------	--------

<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 45	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 45	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 45
--------------------------	-----------------------------------	-------	------------------------------------	-------	---------------------------------------	-------

<b>Información FinancieraTotal:</b>		\$ 4.973		\$ 1.041		\$ 1.041
-------------------------------------	--	----------	--	----------	--	----------

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV07AA Hogares que acceden a vivienda usada	Hogares	124	205	165%

**Proyecto:** 120108 - Asignación de subsidios para arrendamiento temporal y atención al modelo de vivienda compartida

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 12.368	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 21.205	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 21.205
----------------------------------	-----------------------------------	-----------	------------------------------------	-----------	---------------------------------------	-----------

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Información FinancieraTotal:** \$ 12.368 \$ 21.205 \$ 21.205

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV08AA Hogares que acceden arrendamiento tempor	Hogares	5.500	5.828	106%
IV08AB Hogares atendidos en vivienda compartida	Hogares	45	45	100%

**Programa:** 2.5.4 - Convivencia y transformación del conflicto en el hábitat para la vida y la equidad – vecinos y amigos

**Proyecto:** 120109 - Acompañamiento social a los hogares beneficiarios de los bienes y servicios del isvimed

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.452 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.534 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.534

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Información FinancieraTotal:** \$ 1.452 \$ 1.534 \$ 1.534

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV09AB hog inquilinatos con acompañamie social	Porcentaje	100	100	100%
IV09AC Hog con acompaña soc beneficiari isvimed	Porcentaje	100	100	100%

**Programa:** 2.5.6 - Fortalecimiento del sistema municipal habitacional

**Proyecto:** 120110 - Fortalecimiento al sistema habitacional de medellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.189 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.986 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.986

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Información FinancieraTotal:** \$ 1.189 \$ 1.986 \$ 1.986

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV10AA Implementacion del smh	Porcentaje	20	20	100%

**Programa:** 2.5.9 - Intervenciones urbanas y rurales en el marco del cinturón verde

**Proyecto:** 120291 - Asignacion de subsidios para vivienda nueva y mejoramiento de vivienda usada en el cinturón verde

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 51% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 51%

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 26.705 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13.011 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13.011

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.020 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11.681 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11.681

**Información Financiera Total:** \$ 28.725 \$ 24.692 \$ 24.692

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV91AA Hogares que acceden a mejora vivienda cv	Hogares	1.130	1.288	114%
IV91AC Hogares que acceden a viv nueva cv	Hogares	1.939	20	1%

**Observación B / S:** El proyecto programado dentro de la meta y el programa VIPA presentó inconvenientes dado el incumplimiento en la propuesta por parte del socio de la unión temporal

## 2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

**Línea:** 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

**Componente:** 2.5 - Vivienda y hábitat: derechos por la vida digna y la equidad

**Programa:** 2.5.1 - Mejoramiento Integral del hábitat para la vida, la equidad y la cohesión social

**Proyecto:** 130297 - Jve-07-mejoramiento de vivienda

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 750 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 750 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 750

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Información Financiera Total:** \$ 750 \$ 750 \$ 750

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV97AA Hogares que acceden a mejora de vivienda	Hogares	70	0	0%

**Observación B / S:** Los mejoramientos se encuentran adjudicados y están en la etapa de diagnóstico, se ejecutarán para el 2015. Los retrasos en la ejecución se presentaron inicialmente porque no se pudo contratar por Ley de garantías y por la dificultad por parte de los operadores para conseguir la población, ya que muchos no cumplían requisitos.

**Observación Proyecto:** Se solicitó borrar este proyecto pues será ejecutado por Infraestructura a través de la EDU

**Proyecto:** 130352 - Jve-4 mejoramiento de vivienda en la comuna 4 - aranjuez

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.500

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Información Financiera Total:** \$ 2.500 \$ 2.500 \$ 2.500

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV52AA Hogares que acceden a mejora de vivienda	Hogares	282	0	0%

**Observación B / S:** Los mejoramientos se encuentran adjudicados y están en la etapa de diagnóstico, se ejecutarán para el 2015. Los retrasos en la ejecución se presentaron inicialmente porque no se pudo contratar por Ley de garantías y por la dificultad por parte de los operadores para conseguir la población, ya que muchos no cumplían requisitos.

**Proyecto:** 130360 - Jve-90 viviendas dignas corregimiento de santa elena

<b>Síntesis Proyecto:</b>	<b>Eficacia :</b> 0%	<b>Ejec. Financiera :</b> 100%	<b>Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):</b>	0%
<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 2.500	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 2.500	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 2.500
<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
<b>Información FinancieraTotal:</b>	\$ 2.500	\$ 2.500		\$ 2.500

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV60AA Hogares que acceden a mejora de vivienda	Hogares	200	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Los mejoramientos se encuentran adjudicados y están en la etapa de diagnóstico, se ejecutarán para el 2015. Los retrasos en la ejecución se presentaron inicialmente porque no se pudo contratar por Ley de garantías y por la dificultad por parte de los operadores para conseguir la población, ya que muchos no cumplían requisitos.				

**Proyecto:** 140056 - Jve-c2 mejoramiento integral de vivienda

<b>Síntesis Proyecto:</b>	<b>Eficacia :</b> 0%	<b>Ejec. Financiera :</b> 100%	<b>Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):</b>	0%
<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 2.500	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 2.500
<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
<b>Información FinancieraTotal:</b>	\$ 0	\$ 2.500		\$ 2.500

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV56AA Hogares que acceden a mejora de vivienda	Hogares	270	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Los mejoramientos se encuentran adjudicados y están en la etapa de diagnóstico, se ejecutarán para el 2015. Los retrasos en la ejecución se presentaron inicialmente porque no se pudo contratar por Ley de garantías y por la dificultad por parte de los operadores para conseguir la población, ya que muchos no cumplían requisitos.				

### 3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

**Línea:** 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno  
**Componente:** 2.5 - Vivienda y hábitat: derechos por la vida digna y la equidad  
**Programa:** 2.5.1 - Mejoramiento Integral del hábitat para la vida, la equidad y la cohesión social  
**Proyecto:** 130530 - 14pp2-intervención mejoramiento de vivienda en la comuna 2 - santa cruz.

<b>Síntesis Proyecto:</b>	<b>Eficacia :</b> 0%	<b>Ejec. Financiera :</b> 100%	<b>Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):</b>	0%
<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 1.000	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 1.000	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 1.000
<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
<b>Información FinancieraTotal:</b>	\$ 1.000	\$ 1.000		\$ 1.000

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV30AA Hogares que acceden a mejora de vivienda	Hogares	113	0	0%

**Observación B / S:** Los mejoramientos se encuentran adjudicados y están en la etapa de diagnóstico, se ejecutarán para el 2015. Los retrasos en la ejecución se presentaron inicialmente porque no se pudo contratar por Ley de garantías y por la dificultad por parte de los operadores para conseguir la población, ya que muchos no cumplían requisitos.

**Proyecto:** 130531 - 14pp5-implementación del programa mi habitat y mitigación del riesgo en suelo mi mitigable

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 221 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 221 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 221

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Información FinancieraTotal:** \$ 221 \$ 221 \$ 221

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV31AA Hogares que acceden a mejora de vivienda	Hogares	25	0	0%

**Observación B / S:** Los mejoramientos se encuentran adjudicados y están en la etapa de diagnóstico, se ejecutarán para el 2015. Los retrasos en la ejecución se presentaron inicialmente porque no se pudo contratar por Ley de garantías y por la dificultad por parte de los operadores para conseguir la población, ya que muchos no cumplían requisitos.

**Proyecto:** 130532 - 14pp8-mejoramiento de vivienda partiendo de la habilitación de suelos recuperables en la comuna 6 - villa hermosa

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 970 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 970 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 970

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Información FinancieraTotal:** \$ 970 \$ 970 \$ 970

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV32AA Mitigación del riesgo	Obras de mitigación	1	0	0%

**Observación B / S:** Se adelantó el proceso de contratación, la obra será desarrollada por la EDU en el 2015

**Proyecto:** 130589 - 14pp80 - mejoramiento de vivienda comuna 80

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 450 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 450

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Información FinancieraTotal:** \$ 0 \$ 450 \$ 450

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

IV89AA Hogares que acceden a mejora de vivienda Hogares 50 0 0%

**Observación B / S:** Los mejoramientos se encuentran adjudicados y están en la etapa de diagnóstico, se ejecutarán para el 2015. Los retrasos en la ejecución se presentaron inicialmente porque no se pudo contratar por Ley de garantías y por la dificultad por parte de los operadores para conseguir la población, ya que muchos no cumplían requisitos.

**Proyecto:** 130591 - 14pp1-construcción social e integral de vivienda y hábitat

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 1.331	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
<b>Información Financiera Total:</b>		\$ 1.331		\$ 0		\$ 0

**Observación Proyecto:** Este proyecto se trasladó a la Secretaría de Infraestructura desde el mes de febrero por petición de la comunidad.
